Id	Opgavenavn	
1	**Kontrakt**	15-05
2		
3	**Omfang og budget fase**	
4	Registrering	23-08
5	Forundersøgelser ARK /ING,.	23-08
6	Formøde med Frb. Kommune	
7	Beboerønsker	15-08
8	Skitse og forslag 1	
9	Bygherre feedback	
10	Forprojekt	
11	BH godkendelse	23-08
12	Indsendelse af myndighedsprojekt	15-08
13	Myndighedsbehandling	18-11
14	Byggetilladelse	18-11
15		13-05
16	**Hovedprojekt (HP) ark/ING.**	25-09
17	Budget 1	22-06
18	Plan og opstalter	
19	Detailtegninger	
20	Konstruktioner	
21	Afløb	
22	EL	
23	Ventilation	
24	Brand	
25	Lydforhold	
26	Beskrivelser	19-12
27	Projektgranskning	19-12
28	Udbud	
29	Udbudsperiode	
30	Licitation	
31	Kontrakt/projektoptimerimng	
32		
33	**Byggeperiode**	
34	Byggeperiode EF arbejder færdig	
35	Byggeperiodeindretning beboer	

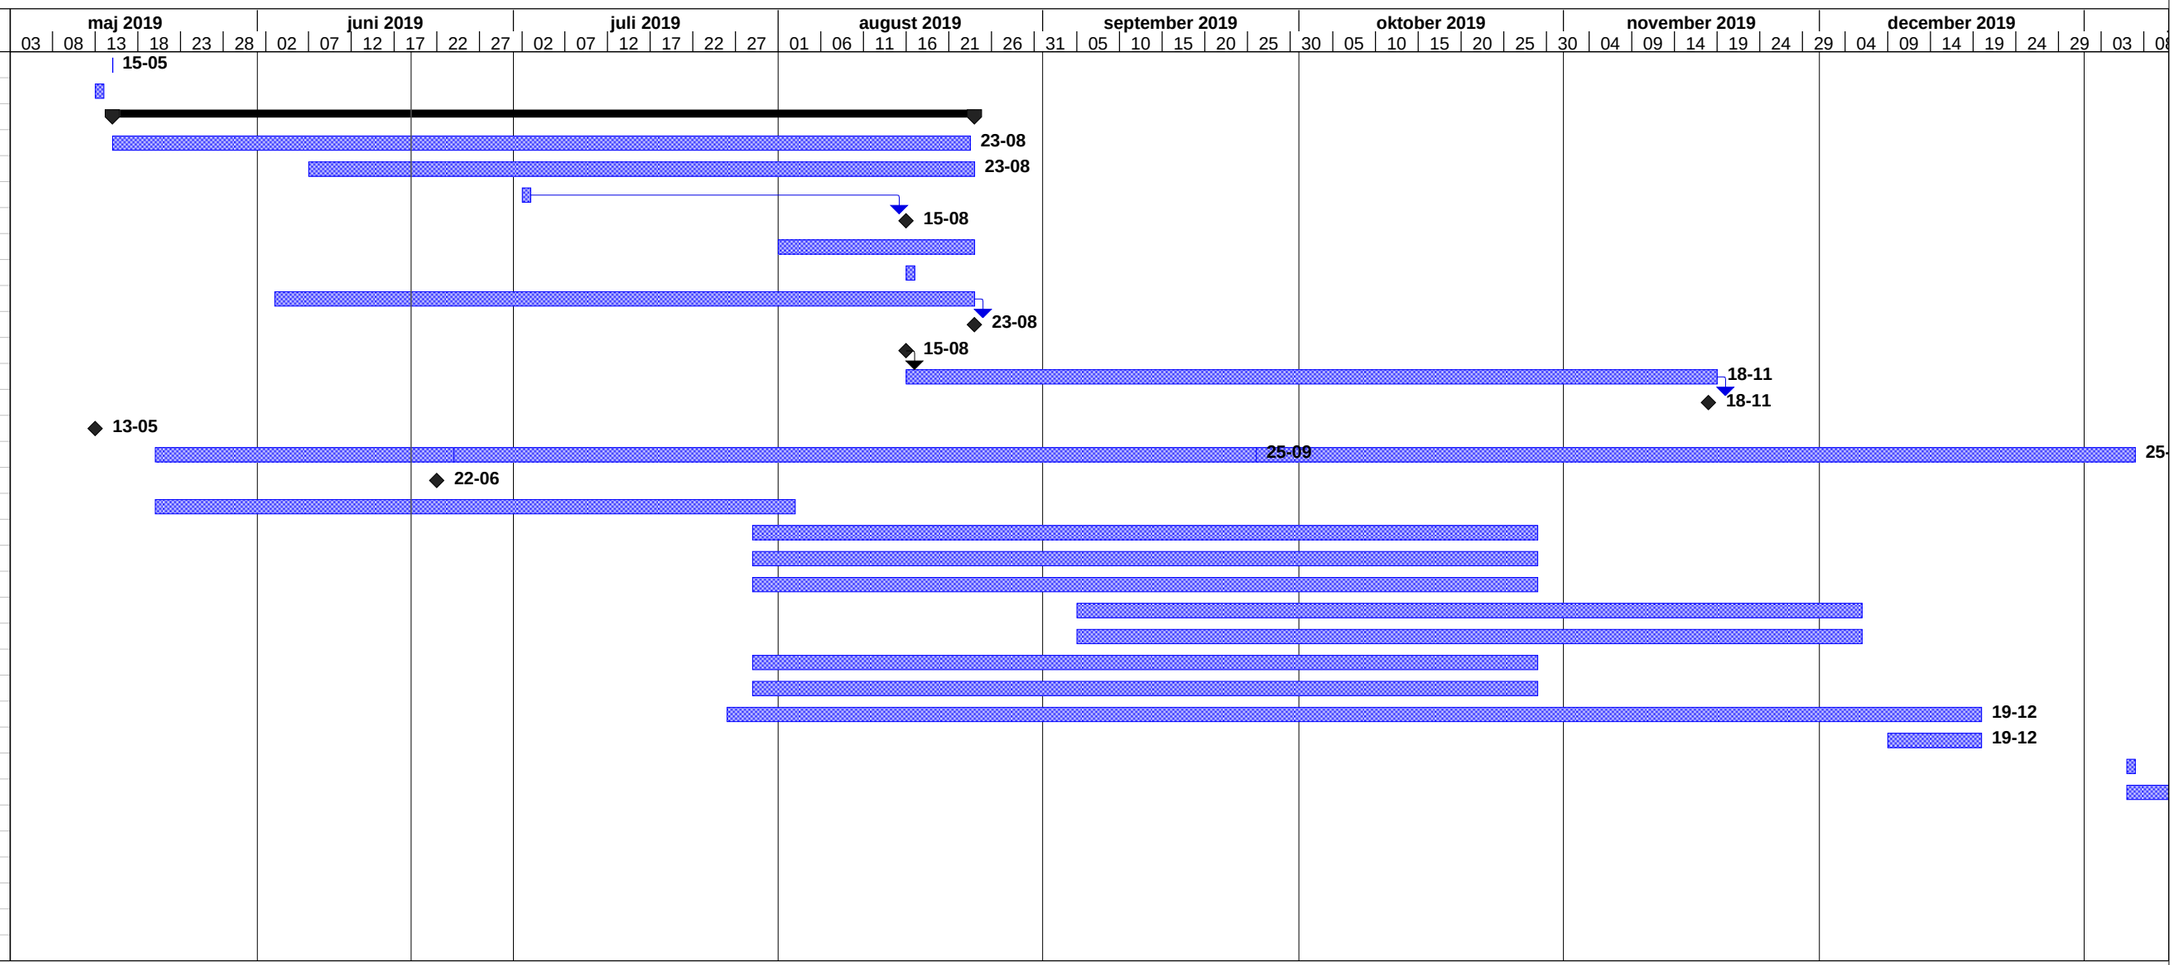

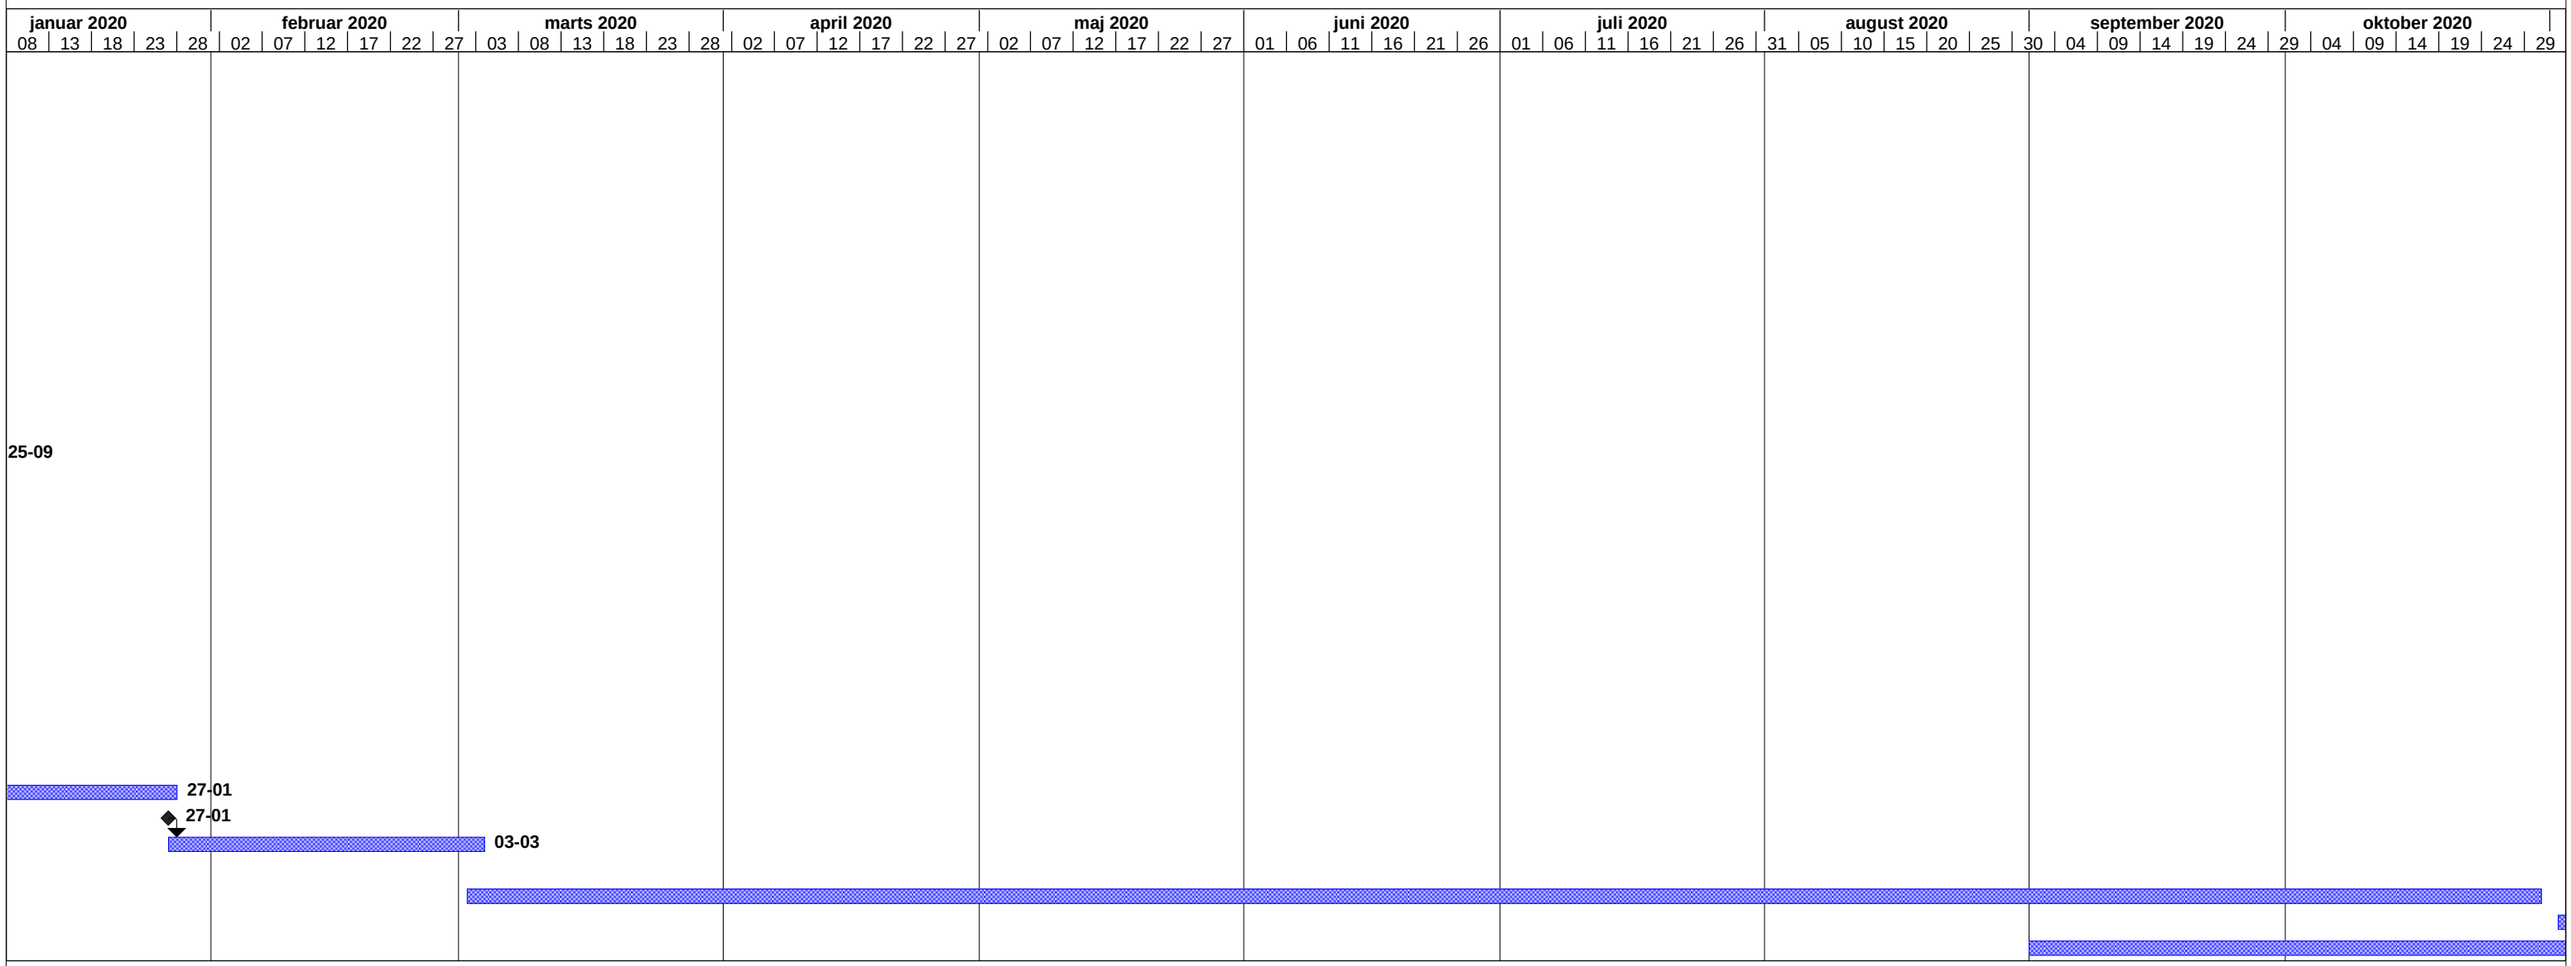
januar 2020
08 13 18 23 28
februar 2020
02 07 12 17 22 27
marts 2020
03 08 13 18 23 28
april 2020
02 07 12 17 22 27
maj 2020
02 07 12 17 22 27
juni 2020
01 06 11 16 21 26
juli 2020
01 06 11 16 21 26
august 2020
31 05 10 15 20 25
september 2020
30 04 09 14 19 24
oktober 2020
29 04 09 14 19 24 29
25-09
27-01
27-01
03-03
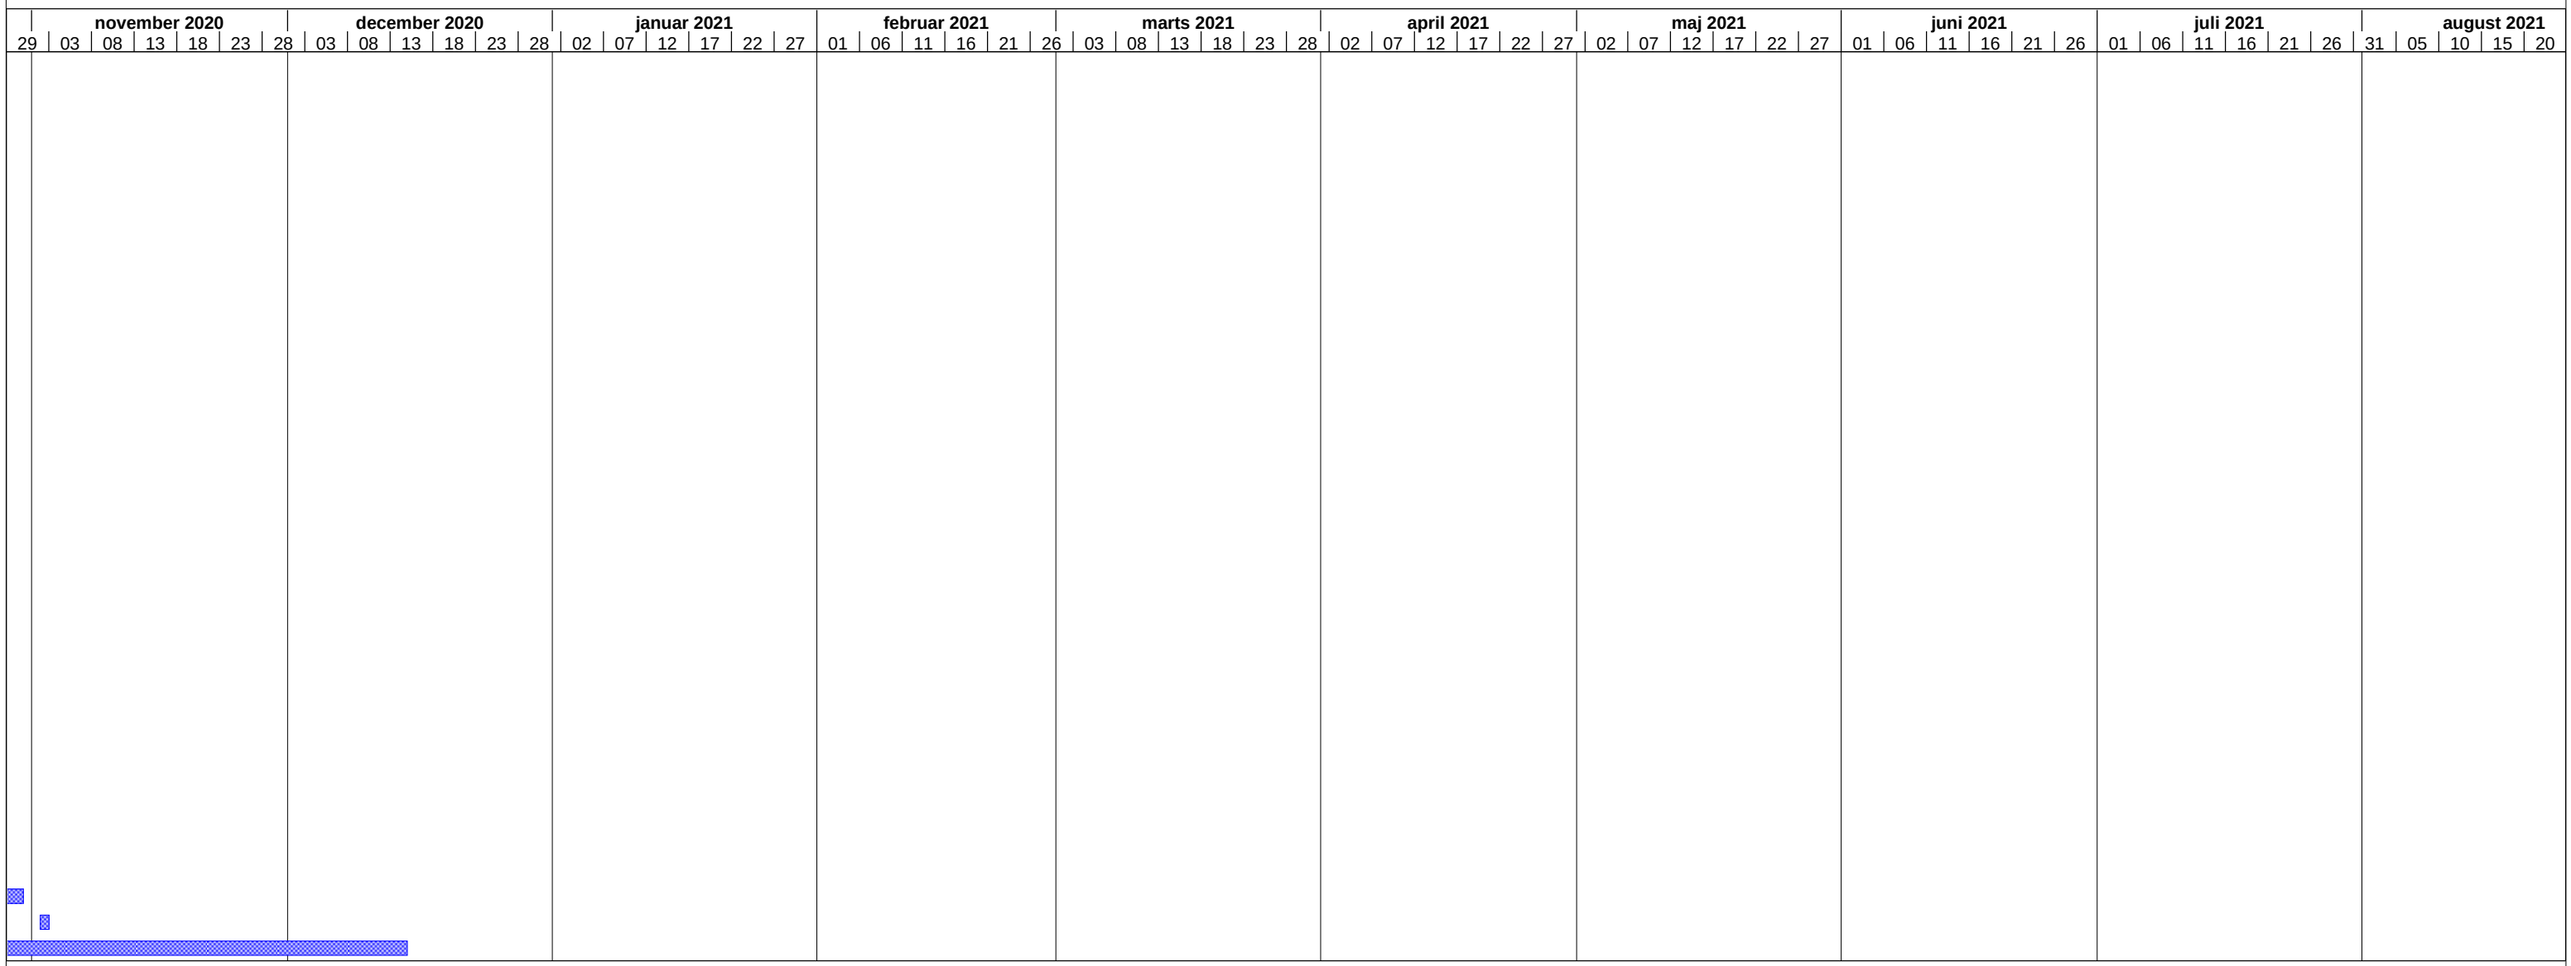
ProjekteringstidsplanFrøbels Alle 1-7 mfl.
PLAN 1 Cobblestone A/S
